



Högstadiet Korsholm

Sanering av golv i Labbkorridoren

17.06.-25.7.2022

1. Allmänna uppgifter

Objekt Högstadiet Korsholm Labbkorridor



Beställare Johan Klemets
Tel:
e-post:

Bakgrund Golvmattorna förnyade i samband med renovering av Labbflygeln.

Tidpunkt 06-07 2022

Utförare

Drytec Oy Ab
Magasingatan 4, 65100 Vasa
FO-nummer 2086555-4

Mikael Anderssen VD

Använda mätinstrument

Ytfuktmätare: Gann Hydrotest LG3
Relativ fuktighet: Vaisala HM40


Saneringen utfördes genom

- sektionering av korridoren Drytec
- undertryck Drytec
- maskinell torkning Drytec
- loniserng Drytec



- rivning klädskap
- golvmaterialet revs
- spackel frästes bort
- Golvet spärrades med Florosil TS

Drytec Skandia
Skandia
Skandia
Skandia

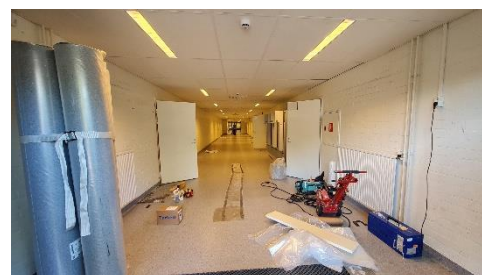



20.07.2022 RH mätning av spackel i korridor RH 51,6 % 21 C 9,24g/m3



Vasa, 17.08.2022

Underskrift

Mikael Anderssen VD

Drytec Ab
