Revahl

Projektnamn / Projektin nimi:	Korsholmsvägens rondellen
Projektnummer / Projektin numero:	2315
Projektansvarig / Projektin johtaja:	Michael Sandelin

STARTDATUM / ALOITUSPÄIVÄ: 24-04-2023
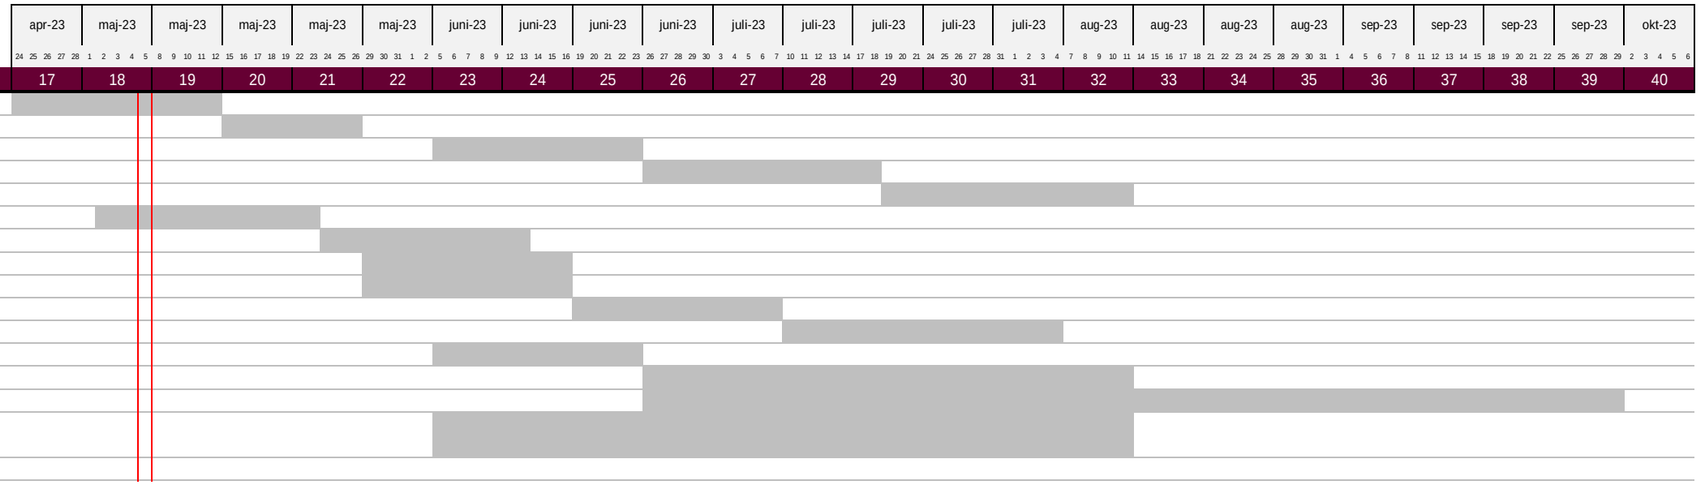
	UPPGIFT / TEHTÄVÄ	START / ALKU	SLUT / LOPPU
1	Huvudentreprenad, Skede 1 (enligt Trafikstyrningsplan)	24-04-2023	12-05-2023
2	Huvudentreprenad, Skede 2 (enligt Trafikstyrningsplan)	15-05-2023	26-05-2023
3	Huvudentreprenad, Skede 3 (enligt Trafikstyrningsplan)	05-06-2023	23-06-2023
4	Huvudentreprenad, Skede 4 (enligt Trafikstyrningsplan)	26-06-2023	18-07-2023
5	Huvudentreprenad, Skede 5 (enligt Trafikstyrningsplan)	19-07-2023	11-08-2023
6	Option 1, fram till önskat delmål	02-05-2023	23-05-2023
7	Option 1, sidolinjerna västerut mot daghem och skola	24-05-2023	13-06-2023
8	Option 1, rivning av befintliga linjer fram till önskat delmål	29-05-2023	16-06-2023
9	Option 1, resterande delar inkl. rivning	29-05-2023	16-06-2023
10	Option 2	19-06-2023	07-07-2023
11	Option 3	10-07-2023	04-08-2023
12	Option 4, Samtidigt som HE skede 3 (enligt Trafikstyrningsplan)	05-06-2023	23-06-2023
13	Option 5	26-06-2023	11-08-2023
14	Grönarbete, hela entreprenaden	26-06-2023	30-09-2023
15	El- och belysningsarbete	05-06-2023	11-08-2023
